

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦ م

Taiz Economic and Social Development Plan 2024-2026

مكتب التخطيط والتعاون الدولي - تعز

MOPIC-Taiz

Taiz Governorate



تقرير ٢٠٢٤م

2024 Report

محافظة تعز - مكتب التخطيط والتعاون الدولي

Taiz Governorate - Planning and International Cooperation Office



Overview of the plan projects

- Total number of the plan projects (864)
at an estimated cost of (479,629,850 \$)
- (154) projects were implemented during the year 2024
at an estimated cost of (25,556,782 \$)
- Ongoing projects (78)
at an estimated cost of (77,448,834 \$)
- Total number of completed and ongoing projects (232)
at an estimated cost of (103,005,616 \$)
- Remaining projects (632)
at an estimated cost of (376,624,234 \$)
- Priority Projects for 2025 (332)
at an estimated cost of (207,039,249 \$)

نبذة عن مشاريع الخطة



- إجمالي عدد مشاريع الخطة (864) مشروعاً
بتكلفة تقديرية (479,629,850 \$)
- تم تنفيذ (154 مشروع) خلال العام 2024م
بتكلفة تقديرية (25,556,782 \$)
- المشاريع قيد التنفيذ (78) مشروعاً
بتكلفة تقديرية (77,448,834 \$)
- إجمالي المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ (232) مشروعاً
بتكلفة تقديرية (103,005,616 \$)
- المتبقي (632) مشروعاً
بتكلفة تقديرية (376,624,234 \$)
- المشاريع ذات الأولوية للعام ٢٠٢٥م (332) مشروعاً
بتكلفة تقديرية (207,039,249 \$)



نبذة عن مشاريع الخطة للعام ٢٠٢٤م

Overview of the plan projects for 2024

المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ للعام ٢٠٢٤م Completed and ongoing projects for the year 2024			اجمالي المشاريع ٢٠٢٤-٢٠٢٦ Total Project 2024-2026		الركيزة Pillar
النسبة % Percentage%	التكلفة Cost \$	العدد Number	التكلفة Cost \$	العدد Number	
5.3%	8,000	1	2,125,004	19	الركيزة الأولى: الحوكمة والإدارة العامة Governance & Public Administration
13.6%	247,786	3	35,192,827	22	الركيزة الثانية: السلام والأمن Peace and Security
28.4%	76,561,837	206	391,860,804	726	الركيزة الثالثة: خدمات أساسية واجتماعية متكاملة Integrated Basic and Social Services
22.7%	26,187,993	22	50,451,215	97	الركيزة الرابعة: تحقيق الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة تعز Realizing the Economic Potential of Taiz Governorate
26.9%	103,005,616	232	479,629,850	864	الإجمالي Total



التحديات والمعالجات

Challenges and Solutions

No.	المعالجات Solutions	التحديات Challenges	م
1	<p>التهيئة والاعداد لمؤتمر المانحين لحشد التمويلات لمشاريع خطة ٢٠٢٥ م ومساهمة الحكومة والقطاع الخاص.</p> <p>Preparation and organization for the donors conference to mobilize funding for the 2025 plan projects and contributions from the government and the private sector</p>	<p>قلة وضعف التمويلات</p> <p>Lack and Weakness of Funding</p>	1
2	<p>تشكيل فريق (إدارة للمشروع) يتولى التنسيق والاشراف على تنفيذ التدخلات للعام ٢٠٢٥ م ، وانشاء منصة الكترونية لقيد كل التدخلات.</p> <p>Formation of a (project management) team responsible for coordinating and supervising the implementation of interventions for the year 2025 and Creating an electronic platform to register all interventions.</p>	<p>ضعف التنسيق في توجيه التدخلات بحسب خارطة مشاريع خطة التنمية</p> <p>Weak coordination in directing interventions according to the development plan projects map</p>	2



التحديات والمعالجات Challenges and Solutions

No.	المعالجات Solutions	التحديات Challenges	م
3	<p>توجيه دولة رئيس الوزراء بنقل وتفويض الصلاحيات اللازمة للسلطة المحلية ومكاتبها بالعلاقة مع اختيار المحافظة من قبل الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع التحول.</p> <p>Instructions from the Prime Minister to transfer and delegate the necessary authorities to the local authority and its offices, given the selection of the governorate by the United Nations as a model for implementing the transformation project.</p>	<p>مركزية التعامل مع التدخلات التنموية في المحافظة من قبل الوزارات والوكالات الأممية</p> <p>Centralized handling of development interventions in the governorate by ministries and UN agencies</p>	3
4	<p>تفعيل اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى مع إضافة ممثل للقطاع الخاص ، وتفعيل لجنة (إدارة المشروع) الفنية ، وإقرار خطة زمنية لاجتماعات اللجنتين ورفع التقارير الدورية ، وتعيين ممثل واحد لكل وكالة أممية في المدينة وخاصة الفاعلة.</p> <p>Activating meetings of the high-level committee and adding a representative from the private sector, activating the technical project management committee, establishing a timeline for meetings of both committees and submitting periodic reports, and appointing one representative for each UN agency in the city , especially the active ones.</p>	<p>ضعف مستوى التنسيق بين السلطة المحلية وبعض الوكالات الأممية وانعدامه مع بعض الوكالات وضعف تواجد موظفين او منسقين أمميين في المدينة</p> <p>Weak coordination between the local authority and some UN agencies, and the complete lack of coordination with others, along with the limited presence of UN staff or coordinators in the city.</p>	4



التحديات والمعالجات Challenges and Solutions

No.	المعالجات Solutions	التحديات Challenges	م
5	<p>عقد اجتماع بين القطاع الخاص والسلطة المحلية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمناقشة أوجه الشراكة وإنشاء المجلس الاقتصادي المحلي.</p> <p>Holding a meeting between the private sector, the local authority, and the United Nations Development Programme to discuss aspects of the partnership and establish the local economic council.</p>	<p>ضعف الشراكة مع القطاع الخاص، وتأخر إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي</p> <p>Weak partnership with the private sector and delay in establishing the local economic council.</p>	5
6	<p>بناء قدرات الكوادر الفنية في مكتب التخطيط والمكاتب الأخرى في المجالات الفنية والإدارية وتبني مشروع حوكمة مكاتب السلطة المحلية.</p> <p>Building the capacities of technical staff in the planning office and other offices in technical and administrative fields, and adopting a project to govern local authority offices.</p>	<p>ضعف بعض القدرات لمكاتب السلطة المحلية ومكتب التخطيط.</p> <p>Weakness of certain capacities within the local authority offices and the planning office</p>	6
7	<p>استعادة التعافي للأجهزة والمكاتب في مجال البيانات والمعلومات وإعداد الدراسات</p> <p>Restoring recovery of offices in the fields of data and information, and preparing studies.</p>	<p>ضعف قاعدة البيانات والمعلومات و الدراسات الميدانية للمشاريع</p> <p>Weak database and information, as well as field studies for projects.</p>	7



التوصيات

Recommendations

- ❑ Invitation to hold a high-level committee meeting with a representative of the private sector in December 2024 to discuss the following:
 - 2024 report and addressing challenges and solutions.
 - Project plan for 2025.
 - Preparation for the donor conference for 2025 projects.
- ❑ Preparation for holding a meeting chaired by the Prime Minister with the relevant ministries, the UNDP Resident Representative, and representatives of the private sector.

- ❑ الدعوة لعقد اجتماع للجنة رفيعة المستوى مع ممثل للقطاع الخاص، خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤م لمناقشة الآتي:
 - تقرير العام ٢٠٢٤م والوقوف على التحديات والمعالجات.
 - خطة خارطة المشاريع للعام ٢٠٢٥م.
 - التهيئة والإعداد لمؤتمر المانحين لمشاريع ٢٠٢٥م.
- ❑ الترتيب لعقد اجتماع برئاسة دولة رئيس الوزراء والوزارات المعنية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي القطاع الخاص.



خطة العام 2025م

2025 Plan

محافظة تعز - مكتب التخطيط والتعاون الدولي

Taiz Governorate - Planning and International Cooperation Office



Goals for the year 2025.

- Strengthening governance principles.
- Enhancing security and peace (the role of reconciliation committees in peacebuilding and services)
- Improving access to basic services.
- Strengthening partnership with the private sector and increasing its developmental contributions.
- Enhancing the utilization of agricultural and fisheries economic opportunities.
- Strengthening economic empowerment and livelihood projects for youth.

أهداف العام 2025 م

- تعزيز مبادئ الحوكمة.
- تعزيز الامن والسلام (دور لجان المصالحة في بناء السلام والخدمات).
- تحسين الوصول للخدمات الأساسية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مساهماته التنموية.
- تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية.
- تعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي ومشاريع سبل العيش للشباب والشابات.



Methodology for Preparing the Priorities of the 2025 Project Map

- The priorities for the year 2025 have been prepared in a participatory manner with the presence of the following entities:
- Representatives of local authority sectors
 - Representatives of civil society organizations
 - Representatives of the private sector
 - UNDP Representative.

منهجية إعداد أولويات خارطة مشاريع ٢٠٢٥م

- تم إعداد أولويات العام ٢٠٢٥م بطريقة تشاركية وبحضور الجهات التالية:
- ممثلي قطاعات السلطة المحلية.
 - ممثلي منظمات المجتمع المدني.
 - ممثلي القطاع الخاص.
 - ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP



منهجية إعداد أولويات خارطة مشاريع ٢٠٢٥م

Methodology for Preparing the Priorities of the 2025 Project Map






برعاية الأستاذ/ نبيل شمسان محافظ محافظة تعز- رئيس المجلس المحلي
ينظم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

**ورش تحديد أولويات المحافظة من المشاريع والتدخلات للعام ٢٠٢٥ م ضمن خطة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية**

وبمشاركة مدراء القطاعات الحكومية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
للفترة من ١١-١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م

محافظة تعز - مكتب التخطيط والتعاون الدولي

Taiz Governorate - Planning and International Cooperation Office

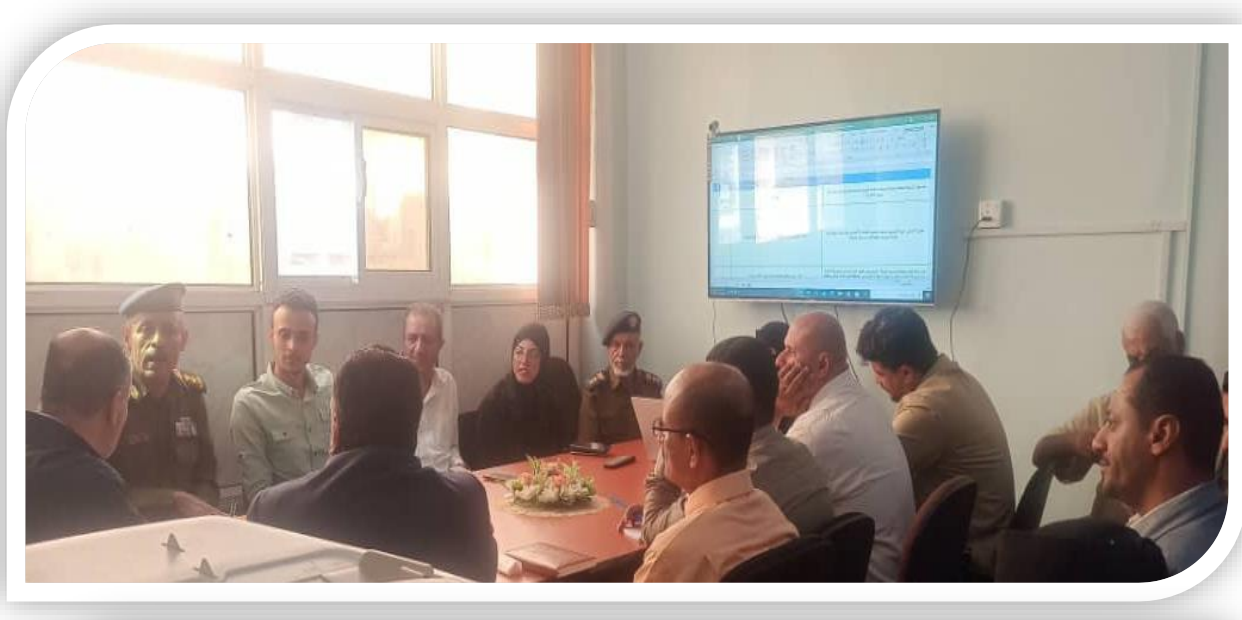

الرقم: ١٤٤٧ هـ / التاريخ: ٢٠٢٤/١١/١٣ الموافق: ٢٠٢٤/١١/١٣
 المرفقات: (١)

محافظة تعز
مكتب التخطيط والتعاون الدولي

الرقم: ١٤٤٧ هـ / التاريخ: ٢٠٢٤/١١/١٣ الموافق: ٢٠٢٤/١١/١٣
 المرفقات: (١)

محافظة تعز
مكتب التخطيط والتعاون الدولي

محضر اجتماع / مناقشة وتحديد أولويات المشاريع والأنشطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة للعام ٢٠٢٥م

مكان الاجتماع	مكتب التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ الاجتماع	الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م
وقت الاجتماع	الساعة 9:00 - 10:30 صباحاً
المشاركون	* المكتب التنفيذي - مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية * مكتب الموارد المائية - مكتب حماية البيئة (البيئي) * مكتب التخطيط الحضري والريفي - مؤسسة معكم - برنامج التنمية الاستراتيجية - مؤسسة اليمن الشاب - منظمة شباب بلا حدود - مؤسسة شباب (س) - مركز كتف الضعيف
المختصون	فرع الهيئة العامة لبيوت الريف
المحاور التي تم مناقشتها	أولويات الاحتياجات والمشاريع لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة للعام ٢٠٢٥م - تحديد أولويات مشاريع مؤسسة الشباب للعام ٢٠٢٥م - عدد ١٤ مشروع يبدأ بمشروع / استصلاح الخطط العمرانية المتدهورة المخطط للتدخل للصفوف السكنية المنخفضة من دون توكيد حتى الصفوف الوسطى والمتوسطة والأعلى بمشروع / توريد عدادات مياه منزلية وتنظيف وصيانتها بمختلف الأحياء والأقطار - تحديد أولويات مشاريع مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية - عدد ٩٨ مشروع يبدأ بمشروع / بناء مركز ٢٦ سبيلين للتوعية والتفوق والقيادة بمشروع / بناء قسم القرب والارامية المنوية في مستشفى خليفة العام
مخرجات الاجتماع	





إجمالي المشاريع ذات الأولوية للعام ٢٠٢٥م The total Priority projects for the year 2025

Total number of projects : **(332)**

With an estimated cost of **(207,039,249 \$)**

إجمالي عدد المشاريع : **(332) مشروعاً**

بتكلفة تقديرية: **(207,039,249 \$)**



المشاريع ذات الأولوية للعام ٢٠٢٥م

Priority projects for the year 2025

أولويات عام ٢٠٢٥م Priority for 2025		اجمالي المشاريع ٢٠٢٤-٢٠٢٦م Total Project 2024-2026		الركيزة Pillar
التكلفة Cost \$	العدد Number	التكلفة Cost \$	العدد Number	
1,965,183	14	2,125,004	19	الركيزة الأولى: الحوكمة والإدارة العامة Governance & Public Administration
24,714,060	10	35,192,827	22	الركيزة الثانية: السلام والأمن Peace and Security
164,890,351	265	391,860,804	726	الركيزة الثالثة: خدمات أساسية واجتماعية متكاملة Integrated Basic and Social Services
15,469,655	43	50,451,215	97	الركيزة الرابعة: تحقيق الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة تعز Realizing the Economic Potential of Taiz Governorate
207,039,249	332	479,629,850	864	الإجمالي Total



The expected impact of implementing the 2025 projects

The main results expected to be achieved in 2025:

- Development of local revenues by 20%
- Governance of work in 7 offices and government institutions.
- Expanding the powers of local authority in leading the local economic development file.
- Building the capacities of 20% of local and security leadership (men and women).
- Establishing the local economic council and announcing the vision for partnership with the private sector.
- Re-operating the Usifera power station with a capacity of 30 megawatts and adding 40 megawatts of solar energy in partnership with the private sector and IFC.

الأثر المتوقع لتنفيذ مشاريع 2025م

أهم النتائج المتوقع تحقيقها في العام ٢٠٢٥ م :

- تنمية الإيرادات المحلية بنسبة 20%
- حوكمة العمل في عدد 7 مكاتب ومؤسسات حكومية.
- توسيع صلاحيات السلطة المحلية في قيادة ملف التنمية الاقتصادية المحلية.
- بناء قدرات 20% من قيادات السلطة المحلية والأمنية (رجال - نساء)
- انشاء المجلس الاقتصادي المحلي واشهار رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
- إعادة تشغيل محطة كهرباء عصفرة بقدرة 30 ميغا، واطافة 40 ميغا بالطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص وIFC.



The expected impact of implementing the 2025 projects

- ❑ Re-operating water wells in areas controlled by the Houthis and providing 20% of the need.
- ❑ Rehabilitation and renovation of 15 km of internal roads and extending 12 km of sewage networks.
- ❑ Completion of 264 economic empowerment projects for young men and women in partnership with the private sector and donors.
- ❑ Transition to livelihood projects in the agriculture sector in 6 districts for 3,000 families.

الأثر المتوقع لتنفيذ مشاريع 2025م

- ❑ إعادة تشغيل آبار المياه في المناطق المسيطر عليها من الحوثيين وتوفير ٢٠% من الاحتياج.
- ❑ إعادة تأهيل وترميم 15 ك طرق داخلية وتمديد 12 ك شبكات صرف صحي.
- ❑ انجاز 264 مشروع تمكين الاقتصادي للشباب والشابات بالشراكة مع القطاع الخاص والمانحين.
- ❑ الانتقال إلى مشاريع سبل العيش في قطاع الزراعة في 6 مديريات لعدد 3,000 أسرة .



مصادر التمويل المحتملة

Potential Funding sources

محافظة تعز - مكتب التخطيط والتعاون الدولي

Taiz Governorate - Planning and International Cooperation Office



مصادر التمويل المحتملة Potential Funding sources

خارجي External	قطاع خاص Private Sector	محلي Local	حكومي Governmental	إجمالي المبلغ Total amount
		3,000,000\$	10,000,000\$	207,039,249 \$



المصفوفة التفصيلية لأولويات البرامج المشاريع والأنشطة للعام ٢٠٢٥ م

The detailed matrix of program, project, and activity priorities for the year 2025

[mopic-taiz.com/plan/economic and social development plan](http://mopic-taiz.com/plan/economic%20and%20social%20development%20plan)



محافظة تعز - مكتب التخطيط والتعاون الدولي

Taiz Governorate - Planning and International Cooperation Office

Thank You
